

Brailleweg e.o.

27 februari 2019



AANPAK RING ZUID



- ▶ Nieuw viaduct Brailleweg, nieuwe aansluiting richting centrum
- ▶ Werkzaamheden komende maanden
- ▶ Vooruitblik

Hoe moet het worden?



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen



Aansluiting
richting centrum

Huidige situatie (2013)
Nieuwe zuidelijke ringweg

Aanpak beeld van deze tour kunnen geen rechtlijnig weggevoerd

Tijdelijk Julianaplein



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen





- ▶ Afbouwen tijdelijk viaduct
- ▶ Verkeer via tijdelijk viaduct
- ▶ Afbreken bestaand viaduct
- ▶ Bouwen nieuw viaduct en aanleg oprit A28 richting Assen
- ▶ Verkeer via nieuw viaduct
- ▶ Afbreken tijdelijk viaduct en aanleg afrit A28 Centrum

Viaduct Brilleweg, volgorde



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen




Afbouwen tijdelijk
viaduct

Viaduct Brilleweg, volgorde



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

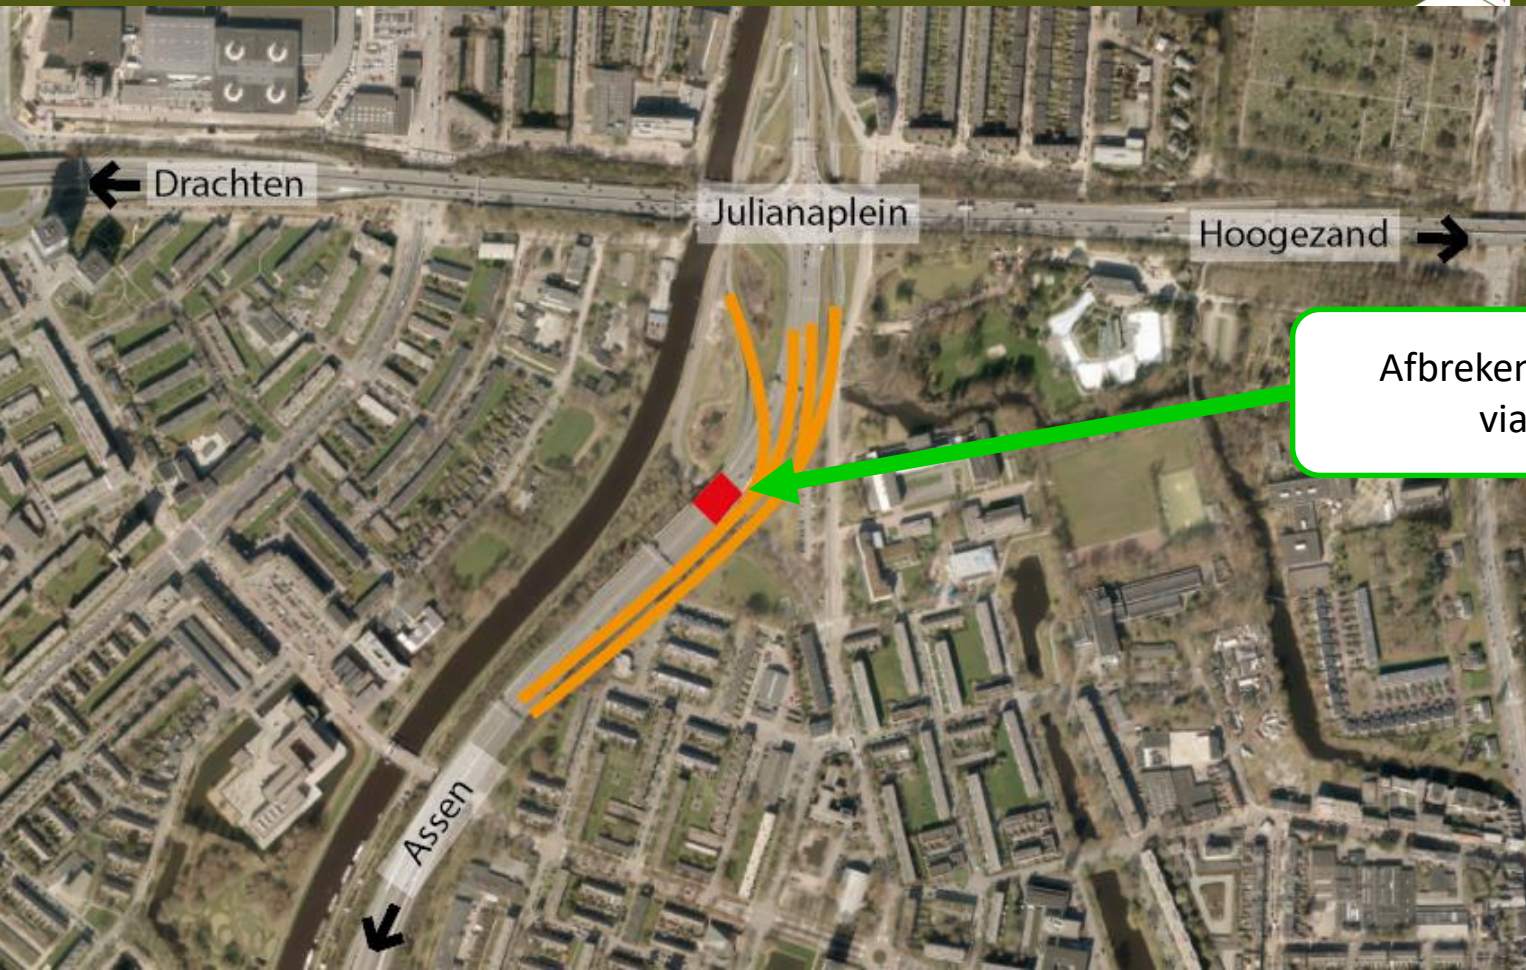


Afbreken bestaand
viaduct

Viaduct Brilleweg, volgorde



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

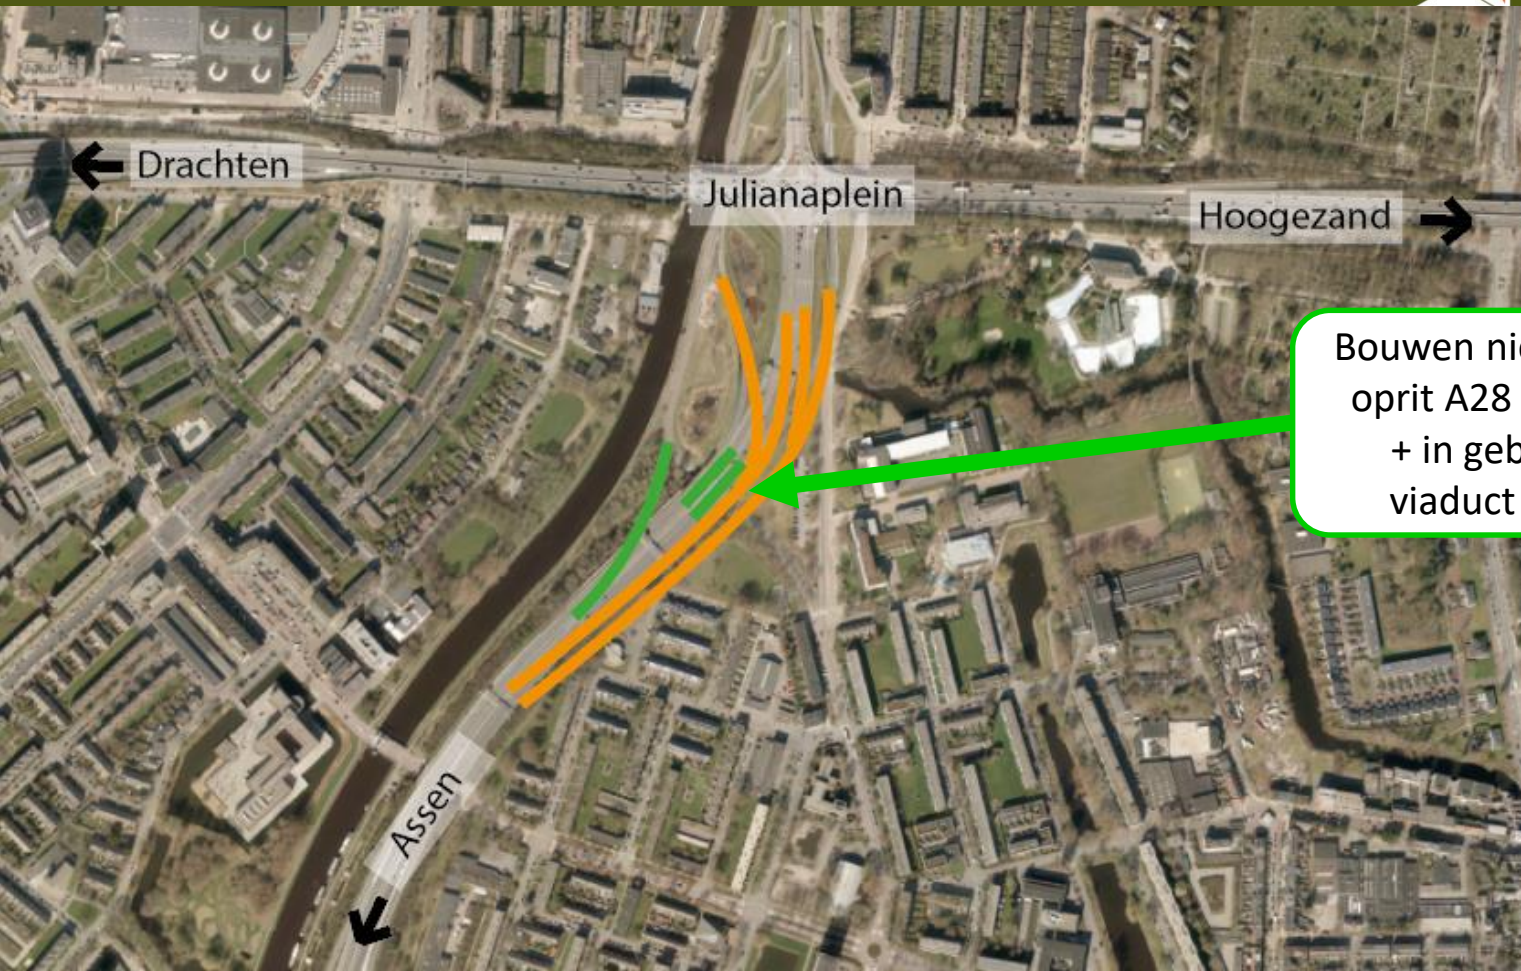


Bouwen nieuw viaduct en
oprit A28 richting Assen
+ in gebruik nemen
viaduct & oprit A28

Viaduct Brilleweg, volgorde



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

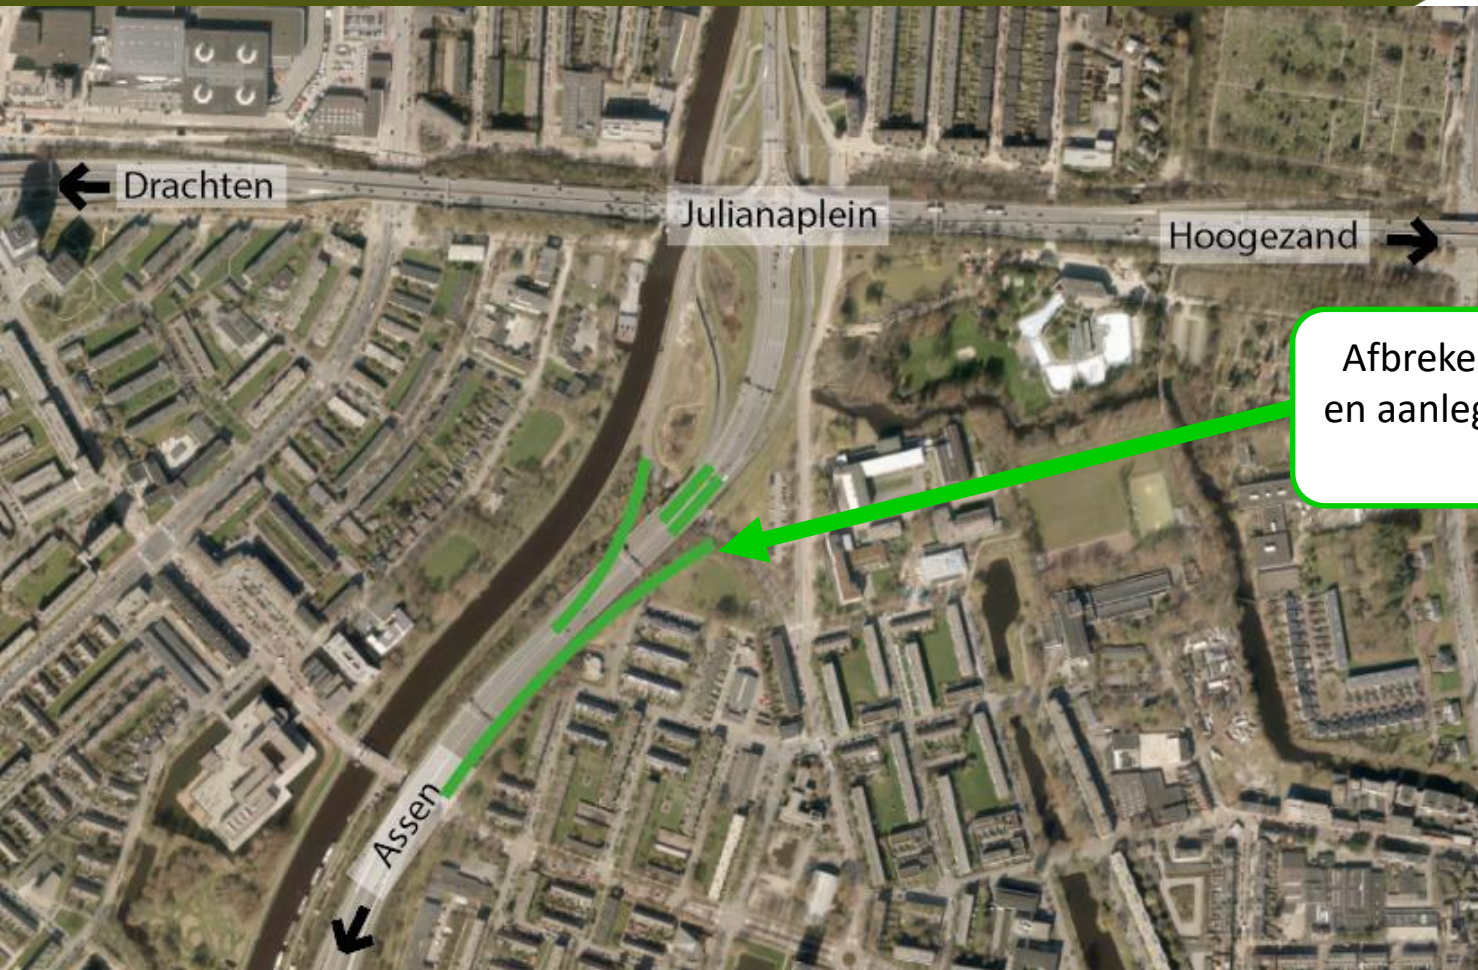


Afbreken tijdelijk viaduct
en aanleg afrit A28 richting
Centrum

Viaduct Brilleweg, volgorde



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

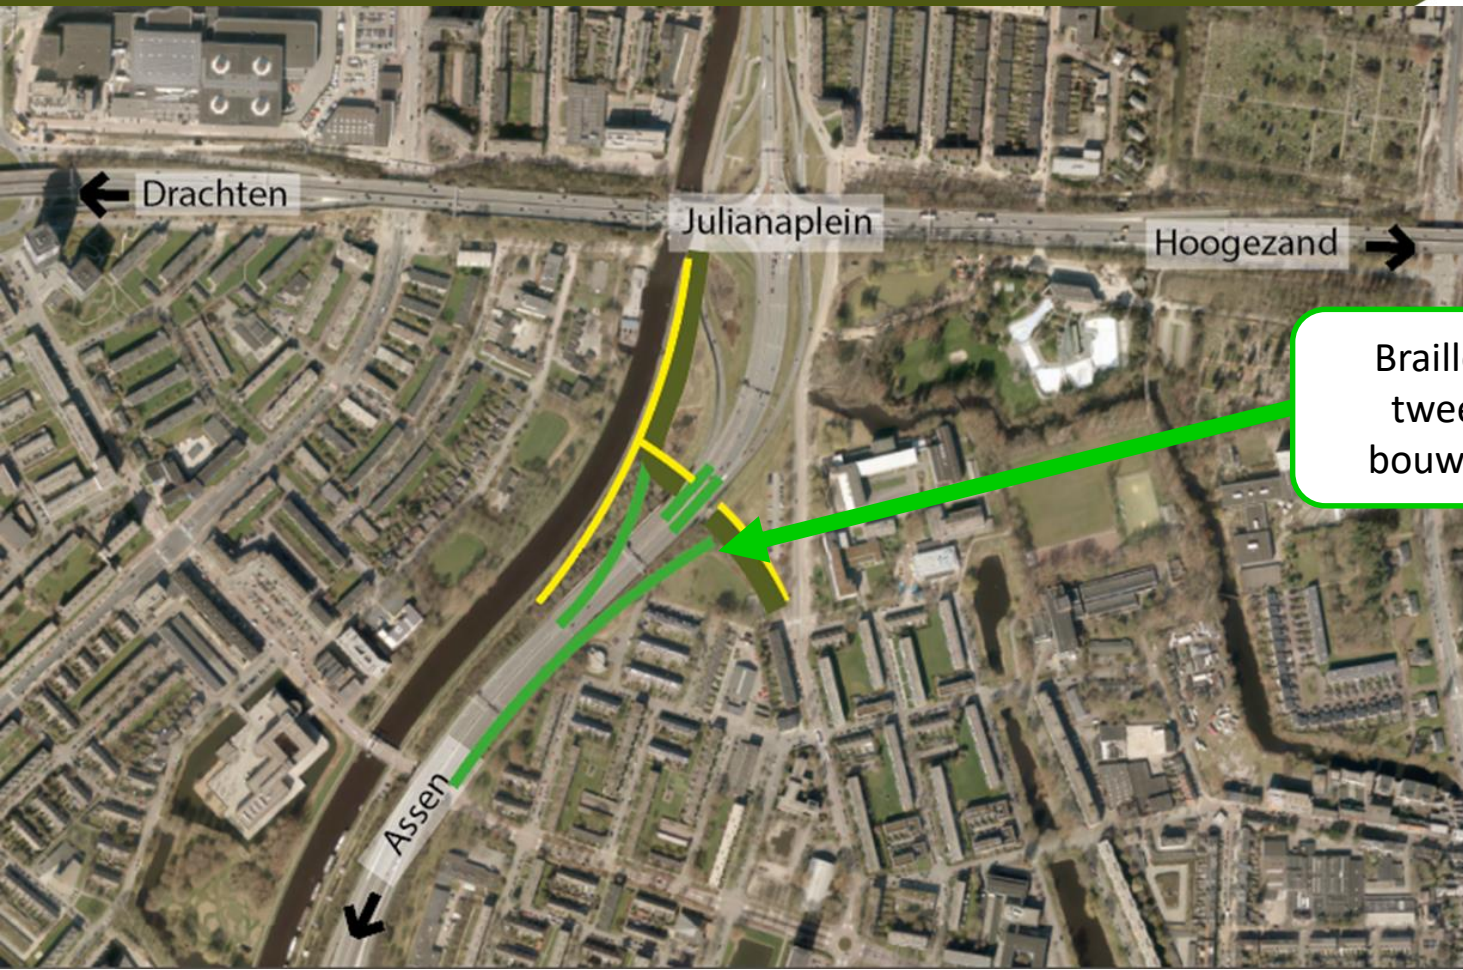

Brilleweg maken we
tweerichting en we
bouwen de fietsvallei.

Werkzaamheden komende maanden



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen





De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd:

- Voorbereidende werkzaamheden
- 1^e omzetweekend: *verkeer richting centrum*
- Eilandfase
- 2^e omzetweekend: verkeer richting Assen
- Tijdelijke situatie: sloop viaduct Brailleweg

Hinder:

- De werkzaamheden voor het omzetten van het verkeer voeren we in de nacht uit binnen de geluidsschermen.
- Het slopen van het viaduct voeren we overdag uit.

Vorbereidende werkzaamheden 4 – 8 maart



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen




► Nachtelijke werkzaamheden

- Slopen fundering constructie verkeersborden
- Plaatsen barriers

1^e Omzetweekend: 8 – 10 maart



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

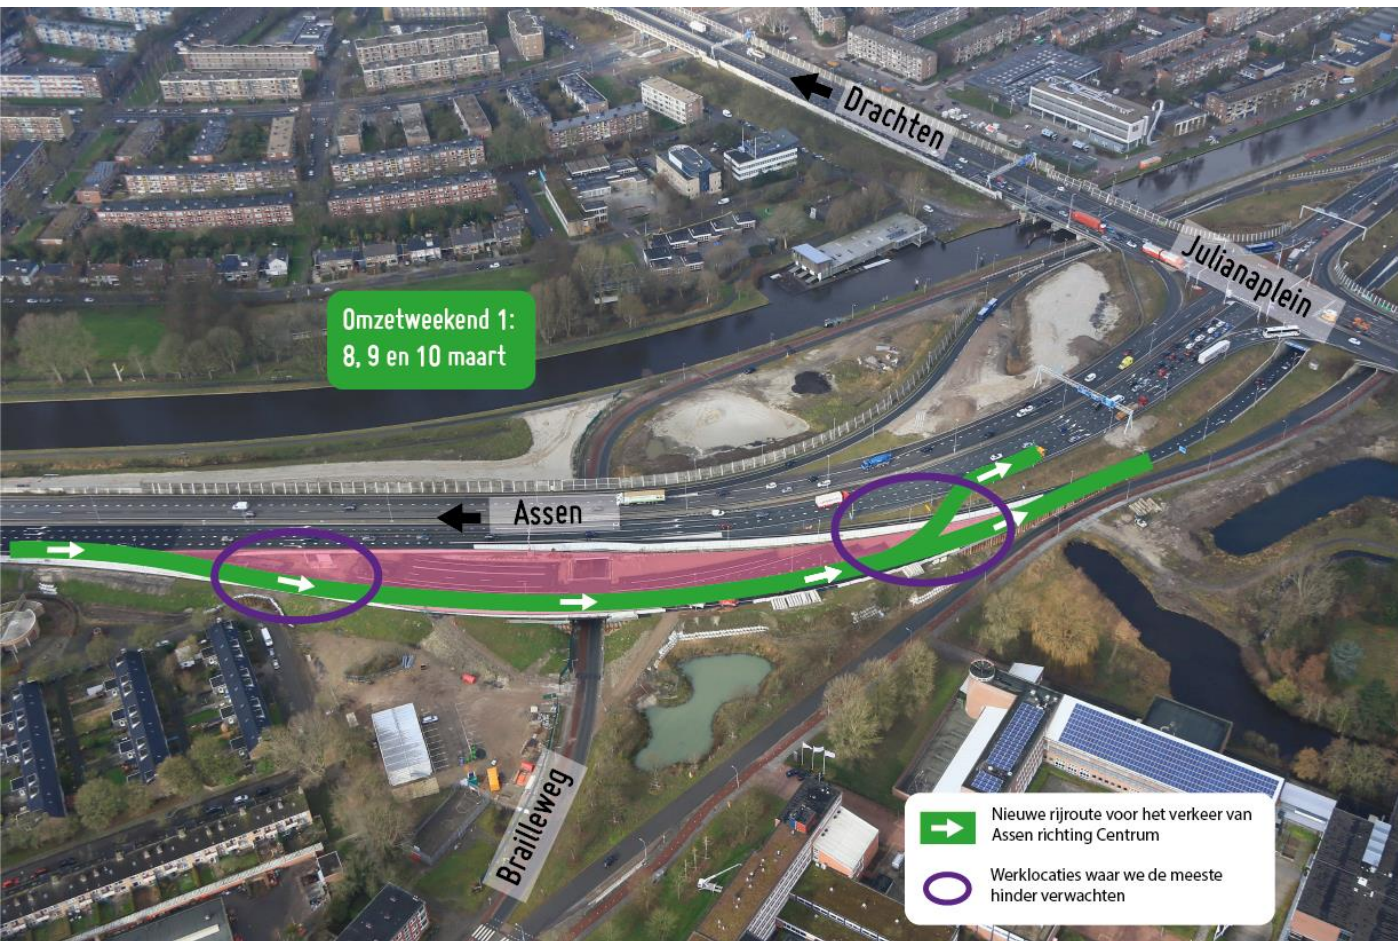

Omzetweekend 1:
8, 9 en 10 maart



Nieuwe rijroute voor het verkeer van
Assen richting Centrum



Werklocaties waar we de meeste
hinder verwachten




- ▶ Nachtelijke werkzaamheden:
 - Verwijderen van bestaand asfalt, aanbrengen nieuw asfalt
 - Verwijderen lichtmasten en vangrail
 - Slopen fundering constructie verkeersborden
 - Plaatsen barriers en geluidschermen
 - Verkeersregelaar op Vondellaan t.b.v werkverkeer
- ▶ Na dit weekend rijdt het verkeer vanaf Assen richting het centrum over het tijdelijk viaduct.

Eilandfase: 11 maart – 5 april



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

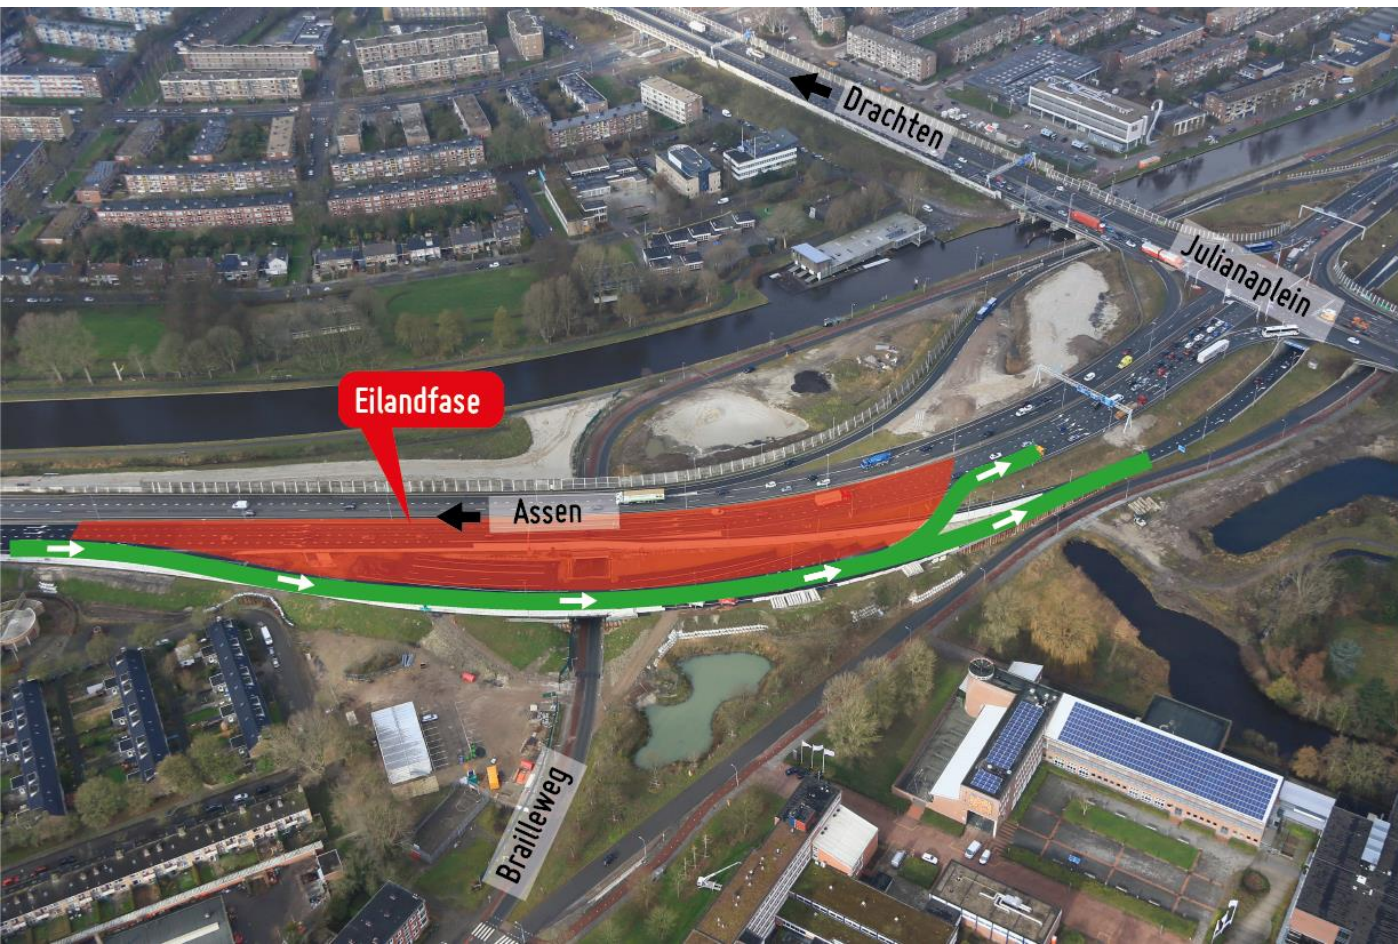



► Nachtelijke en weekendwerkzaamheden

11 maart – 18 maart

- Afbranden damwanden
- Verwijderen asfalt (nacht van dinsdag 12 op woensdag 13 maart)

18 maart – 24 maart

- Aanbrengen fundering
- Asfalteren en aanbrengen lijnen op de weg
- Gedeeltelijke sloop bestaand viaduct:
 - Alleen overdag op zaterdag 23 maart en zondag 24 maart.
 - De Brailleweg is dicht van zaterdag 23 maart 06:00 uur tot maandag 25 maart 06:00 uur.



► Nachtelijke en weekendwerkzaamheden

25 maart – 29 maart

- Plaatsen liggers tijdelijk viaduct: maandag 25 maart 20:00 uur – dinsdag 26 maart 06:00 uur. Eventueel ook nacht van 26/27 maart. Tijdens deze werkzaamheden is de Brailleweg afgesloten voor alle verkeer.
- Aanbrengen fundering


1 april – 5 april

- Plaatsen barriers

2^e omzetweekend: 5 april – 8 april



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

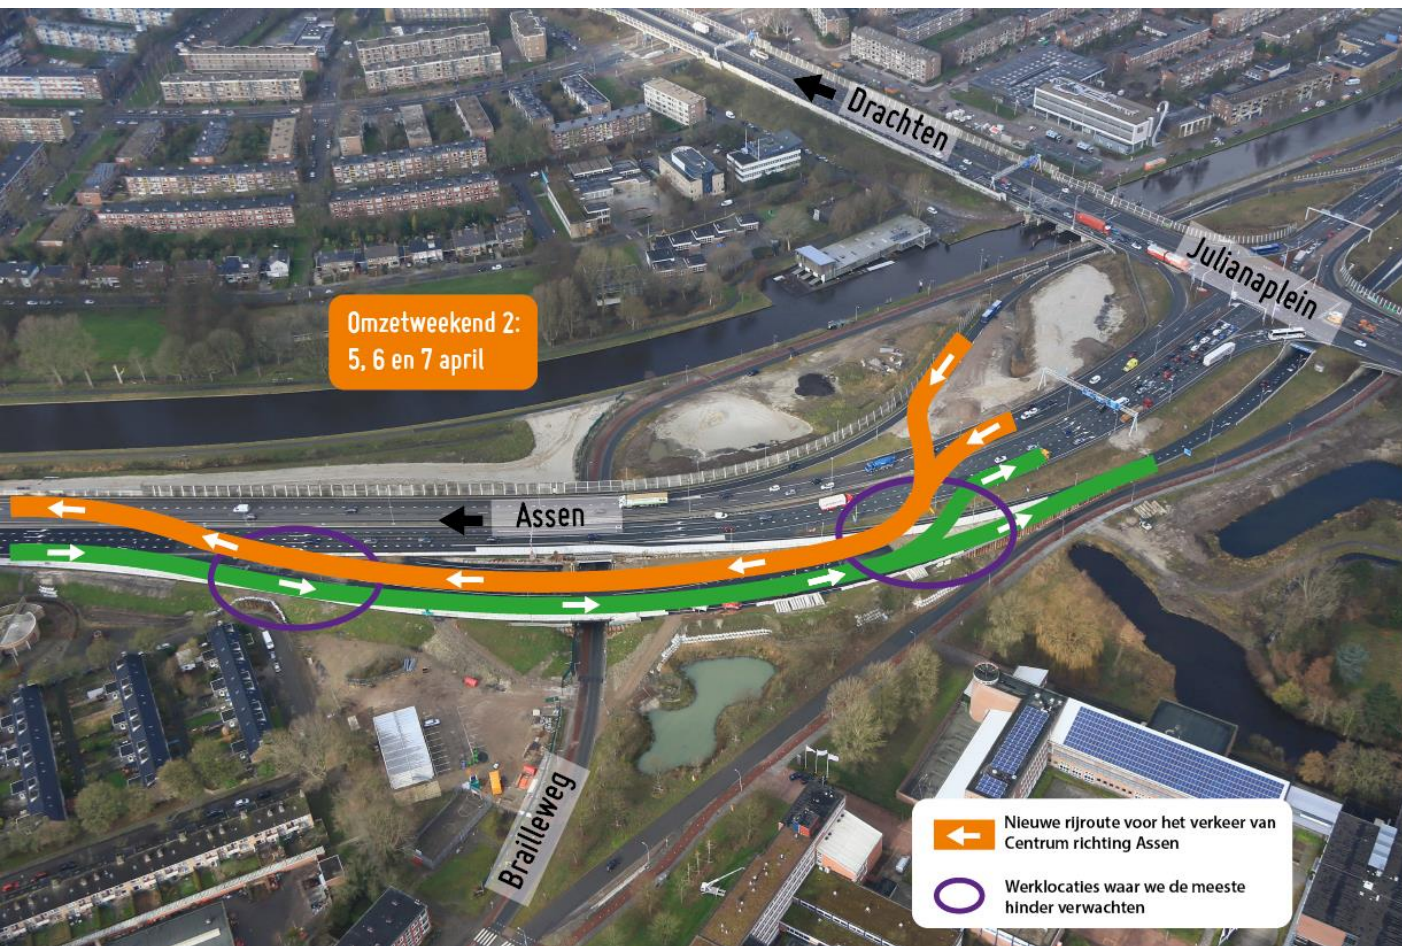




- ▶ Nachtelijke en weekendwerkzaamheden
 - ▶ Verwijderen asfalt, middenberm en vangrail
 - ▶ Aanbrengen barriers en lijnen op de weg
- ▶ Na dit weekend rijdt het verkeer richting Assen ook over het tijdelijk viaduct.

Tijdelijke situatie - werkzaamheden 8 april tot 6 mei



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

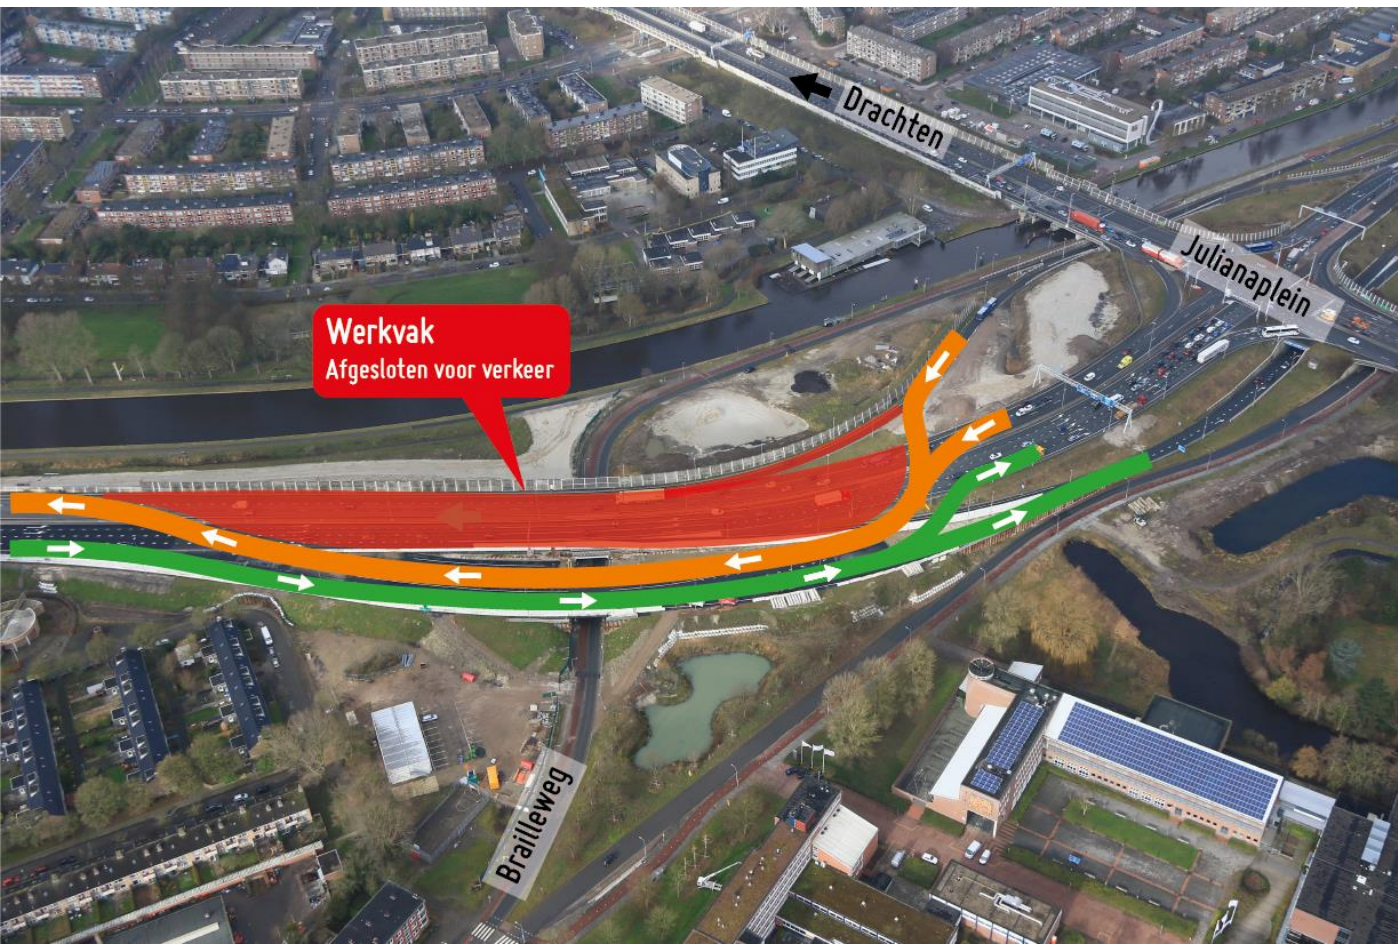



- ▶ Alle verkeer rijdt over het tijdelijk viaduct
- ▶ Afrondende werkzaamheden zoals verwijderen lichtmasten en vangrail, sloop middenbarrier en sloop geluidschermen.
- ▶ Sloop van het bestaande viaduct.
 - ▶ Overdag en in het weekend.
- ▶ **Brilleweg afgesloten zaterdag 20 april 06.00 uur tot 6 mei 6.00 uur (meivakantie)**

