



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

Laan Corpus den Hoorn 102-4
9728 JR Groningen
T 088 797 43 95
E info@aanpakringzuid.nl
I www.aanpakringzuid.nl

[Twitter](#) [Facebook](#) [Instagram](#) @aanpakringzuid

Aan de bewoners van dit adres

Update werkzaamheden Paterswoldseweg t/m oktober

Groningen, 8 juli 2021

Onderwerp: **Update werkzaamheden Paterswoldseweg t/m oktober**
Contactpersoon: Bert Kramer
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2208

Geachte heer/mevrouw,

Combinatie Herepoort werkt bij u in de omgeving aan de zuidelijke ringweg. In deze brief geven we u een update van de werkzaamheden die we de komende tijd uitvoeren.

Werkzaamheden bestaand viaduct Paterswoldseweg

Op dit moment brengen we buispalen aan voor de fundering van het viaduct. Dit duurt tot en met 9 juli. We zijn echter iets later gestart met het aanbrengen van damwandplanken dan in de vorige brief vermeld. Deze werkzaamheden duren ook tot en met 9 juli.

De komende maanden zijn we bezig met betonwerk van het nieuwe landhoofd en betonwerk van de uitbreiding van het bestaande landhoofd.

Daarnaast brengen we gewapende grond aan als fundering van het nieuwe wegdek.

Ook verwijderen we de overhoogte van de aangebrachte voorbelasting, die nodig is voor het verbreden van de weg.


Deze werkzaamheden voor de fundering van het nieuwe viaduct en de verbreding van de weg zijn nodig zodat we eind oktober de liggers voor het viaduct kunnen leggen en het viaduct verder kunnen afbouwen. Het viaduct wordt eind februari 2022 in gebruik genomen.

Resultaat inpakken tijdelijk viaduct Paterswoldseweg tegen geluidsoverlast

In de periode van donderdag 27 mei 2021 tot en met woensdag 9 juni 2021 hebben we geluidswerend materiaal aangebracht om de geluids- en trillingshinder te verminderen. Vooraf en na aanbrengen van het materiaal is geluidsonderzoek gedaan. De meetresultaten geven aan met name het geluid van zware vrachtwagens rond de 8 db(A) is verminderd. Dat komt nagenoeg overeen met de prognose die vooraf is berekend.

Hoewel de geluids- en trillingshinder daarmee is verminderd, is de overlast niet weg. We blijven met direct omwonenden in gesprek over mogelijk aanvullende maatregelen. Op de website hebben we een uitgebreider artikel gepubliceerd.

<https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2021/07/geluidsafname-maatregelen-viaduct-paterswoldseweg/>

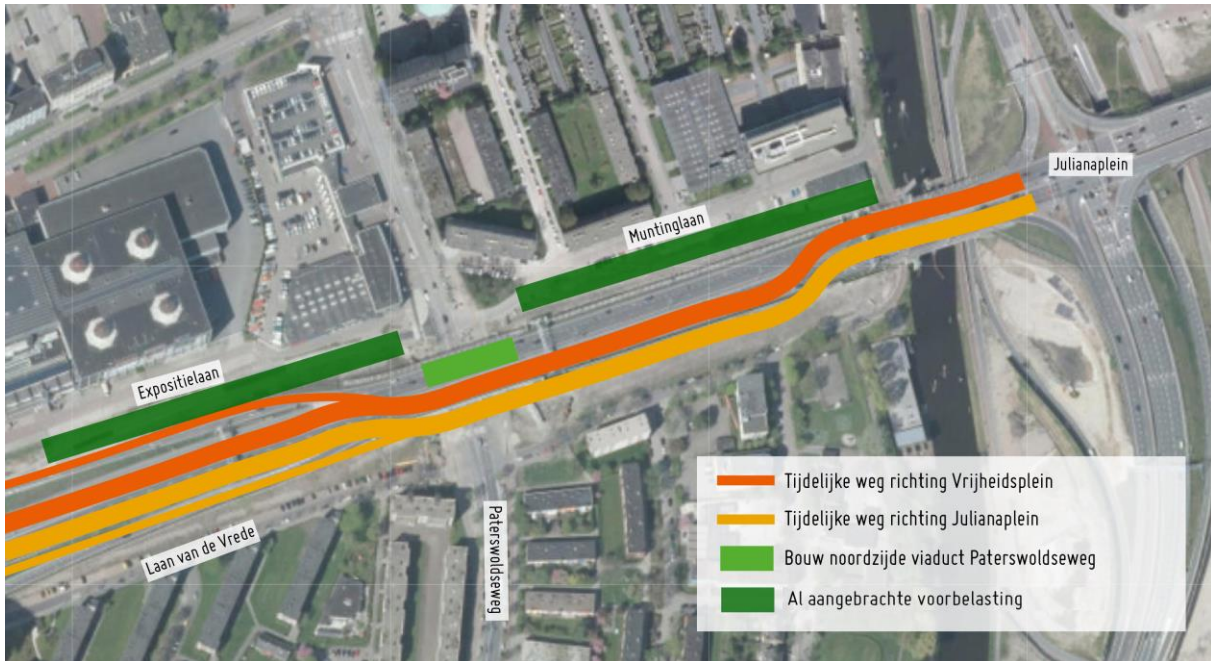

Afbeelding: Werkzaamheden rondom Paterswoldseweg

Actuele informatie

De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden.

Vragen en klachten

Heeft u vragen, zorgen of klachten over de werkzaamheden? Dan kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of www.loketverkeer.werkzaamheden@ groningen.nl of via de website www.aanpakringzuid.nl. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Julianaplein of blijf op de hoogte via onze SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.

Met vriendelijke groet,



Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort



AANPAK RING ZUID

Werkzaamhedenoverzicht

In onderstaande tabel staan de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van: nacht- en zondagwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit op maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Wanneer				
Donderdag 1 juli, tot en met vrijdag 9 juli	Intrillen damwanden (noordzijde, links en rechts van de onderdoorgang)	maandag t/m zaterdag, overdag	Geluid machines, trillingen, meer bouwverkeer	-
juli tot en met oktober	Betonwerk, aanbrengen gewapende grond, verwijderen overhoogte	maandag t/m zaterdag, overdag	Geluid machines, meer bouwverkeer	-
