

Onderwerp Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid mei - augustus 2021

Steller Gerd Boerema en Evelien Struijk

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 89 98 Bijlage(n) 2

Ons kenmerk 495103-2021

Datum 27-10-2021 Uw brief van

Uw kenmerk -



Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het project Aanpak Ring Zuid (ARZ). Met de rapportage voeren wij uw motie van 27 juni 2018 uit waarin wordt gevraagd uw raad eens per vier maanden te informeren over de voortgang van het project. De rapportage beschrijft in kort bestek de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project Aanpak Ring Zuid over de periode 1 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021, aangevuld met de actualiteit. De rapportage wordt tevens door het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voorgelegd.

In de brief bij de voorgaande voortgangsrapportage, lieten wij u weten hoe wij invulling hebben gegeven aan de motie 'vinger aan de pols'. In deze brief zullen wij ingaan op de laatste stand van zaken met betrekking tot de afspraken die zijn gemaakt met diverse bewoners. Ook gaan wij in op de wijze waarop wij invulling geven aan de motie 'Rust voor de Buitenhof'. Daarnaast informeren wij u over de faunapassage bij Gyas en koppelen wij de reguliere voortgang social return terug.

Mijlpalen

Na afsluiten van de Vaststellingsovereenkomst (VOK) maakt CHP meters in de uitvoering. Dat is buiten goed zichtbaar en goed voor de voortgang van het project. Op steeds meer plekken worden de contouren van de nieuwe ringweg goed zichtbaar. In juni is het nieuwe viaduct in de A28 over de Brailleweg volledig open gegaan. Met de realisatie van dit viaduct is weer een mooie mijlpaal bereikt. Afgelopen zomer was de ringweg in de zomer zes weken dicht vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan de Europaweg. Tijdens deze zes weken werkte CHP aan de verbreding van de noordelijke rijbaan.

Een volgend belangrijk moment is de aanleg van het tijdelijk Julianaplein. Vanaf 11 februari wordt het Jualiaplein in verschillende fases afgesloten voor een periode van 13 weken. In deze 13 weken vinden grootschalige werkzaamheden plaats en wordt veel verkeershinder verwacht. Ook staan er de komende periode omleidingen voor fietsers gepland. Wij blijven hier extra aandacht voor vragen en gaan dit ook toetsen.

Omgeving

Begin oktober is een bijeenkomst met bewoners van de Zaayer georganiseerd om de genomen maatregelen te evalueren. De maatregelen zijn positief ontvangen; dit geldt zowel voor de overlast reducerende maatregelen alsook voor de verbetering in de communicatie. Bewoners geven ook aan zich gezien en gehoord te voelen.

In september heeft een bijeenkomst met bewoners van de Julianaweg plaatsgevonden om ze bij te praten over de geluidswering en aankomende werkzaamheden. Het aanbrengen van een tijdelijk geluidsscherm is begin november voorzien.

De Buitenhof

In mei 2020 heeft uw raad een krediet ter beschikking gesteld voor de realisatie van stil asfalt op de A7 bij Hoogkerk. Wij hebben van RWS begrepen dat de realisatie van dit stille asfalt kan worden meegenomen in een groot onderhoudsbestek. Op dit moment leggen we de laatste hand aan een overeenkomst met RWS zodat de realisatie van dit asfalt ook daadwerkelijk in het groot onderhoudsbestek kan worden meegenomen. De planning is dat dit groot onderhoud in 2024 kan worden uitgevoerd. Het uitvoermoment moet worden bepaald in nauwe samenhang met de werkzaamheden vanuit Aanpak Ring Zuid.

Motie Rust voor de Buitenhof

In uw raadsvergadering van 28 april heeft u de motie 'Rust voor de Buitenhof' aangenomen. Daarin heeft u ons verzocht om samen met bewoners van de Buitenhof, omliggende buurten en de bedrijven van het bedrijventerrein een verkenning te doen naar de mogelijkheden van een zonnewal (geluidswal met groenvoorziening en zonnepanelen) van Stadspark tot viaduct Hoogkerk. Wij zijn op dit moment bezig met de uitvoering van dit haalbaarheidsonderzoek naar een duurzaam geluidsscherm dat verkeerslawaaï tegenhoudt en tegelijkertijd energie opwekt. Samen met bewoners, adviesbureau Sweco, akoestisch bureau WMA, Vereniging Wijkraad Hoogkerk en Rijkswaterstaat hebben we de handen ineengeslagen om de mogelijkheden van een zonnescherm te verkennen.

We verwachten de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek in het eerste kwartaal van 2022 aan uw raad te kunnen aanbieden. De uitkomsten van de verkenning helpen ook om financieringsopgave scherper in beeld te krijgen. Dit helpt om gericht cofinanciering te organiseren bij bijvoorbeeld diverse

fondsen, partneroverheden, (omliggende) bedrijven en overige bronnen. In de gemeentebegroting voor 2022 is een planbudget opgenomen voor geluidwerende maatregelen voor de Buitenhof. De verwachting is dat hiermee het ‘akoestisch gat’ wat ontstaan is, gedicht kan worden. Er ligt echter een wens om langs een bredere zone geluidswerende maatregelen toe te passen, waartoe het haalbaarheidsonderzoek uitkomst dient te bieden. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar een zonnescerm willen we in samenhang in een raadsvoorstel aan u voorleggen.

Faunapassage Ketwich Verschuurbrug


In de gemeente Groningen werken we vanaf 1994 met een Stedelijke Ecologische Structuur (SES kaart met daarop de knelpunten in de ecologische verbindingen). In het groenplan Vitamine G is de meest recente versie opgenomen. Eén van de knelpunten in de ecologische structuur is de oversteek bij de Van Ketwich Verschuurlaan nabij de A28, die in het kader van de aanpak van de zuidelijke ringweg wordt opgelost. Uit de verkenning van de mogelijke alternatieven is een ‘looprichel’ aan de oostelijke zijde onder de Ketwich Verschuurbrug als enige haalbare variant gekomen.

Roeivereniging Gyas heeft bij projectbureau Aanpak Ring Zuid haar zorgen en bezwaren neergelegd. Zij geeft aan dat de looprichel onder de oostelijke zijde van de brug de doorvaart voor roeiboten die de stad in willen belemmert. Daardoor moeten alle roeiboten door het middelste gat. Volgens Gyas liggen er in het vaarseizoen met regelmaat boten voor het middelste bruggat, te wachten op de brugopening.

Roeivereniging Gyas heeft een tegenvoorstel aangeboden voor mogelijke aanpassingen aan de geplande faunapassage. Wij zijn hierover met Gyas in gesprek en zullen deze gesprekken naar verwachting op korte termijn afronden. Bij de volgende voortgangsrapportage komen we hier weer op terug.

Regulier SROI

Vanuit ons eigen Bureau Social Return informeren wij u op deze plek over de resultaten van CHP over het kalenderjaar. De waarde van de inzet ligt op ruim 5,6 miljoen euro. Hiermee heeft CHP inmiddels volledig voldaan aan haar SROI verplichtingen voor het project.

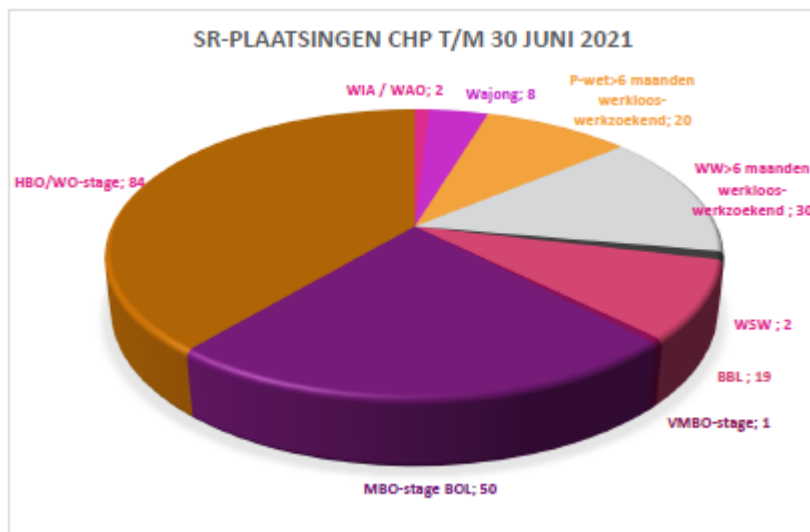

Werkgelegenheidsrapportage

CHP heeft, als onderdeel van hun inschrijving, aangeboden om de economische effecten te monitoren. De verantwoording vindt drie keer plaats, verspreid over projectperiode. Met de vertraging van 36 maanden is de interval tussen deze rapportages ook groter. CHP is bezig deze rapportage op te stellen, we verwachten deze te ontvangen voor het einde van 2021.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
