

Intrillen damwandplanken wekelijkse rapportage



Periode: 27 september tot
4 oktober 2019



Voortgang

Dit rapport beslaat de werkzaamheden rond het intrillen van damwandplanken voor de verdiepte ligging van vrijdag 27 september tot vrijdag 4 oktober. We hebben met één heistelling gewerkt aan het intrillen van de damwandplanken. In totaal zijn er in vijf dagen 50 damwandplanken ingetrild. De teller staat hiermee op 1425 damwandplanken in totaal.


De metingen van geluid en zettingen zijn onder de vastgestelde grenswaarden gebleven, met één uitzondering. Dit betreft een overschrijding van de geluidsbelasting van het verwijderen van de verharding van het fietspad Hereweg. De werkwijze is na deze constatering aangepast. De respons vanuit de omgeving is in dit rapport weergegeven. Het aantal meldingen over geluid, trillingen en schade is afgenomen ten opzichte van vorige week.

De afgelopen week hebben we damwandplanken ingetrild voor de zuidelijke damwand ter hoogte van de Kempkensberg. We werken sinds 24 september met één heistelling vanaf de hoofdingang van DUO/Belastingdienst richting de Hereweg.

De komende week werken we met deze stelling verder op deze plek. Het intrillen doen we komende week op doordeweekse dagen tussen 07.00 en 17.00 uur.

Actuele planning

In de afbeelding hieronder ziet u de planning.

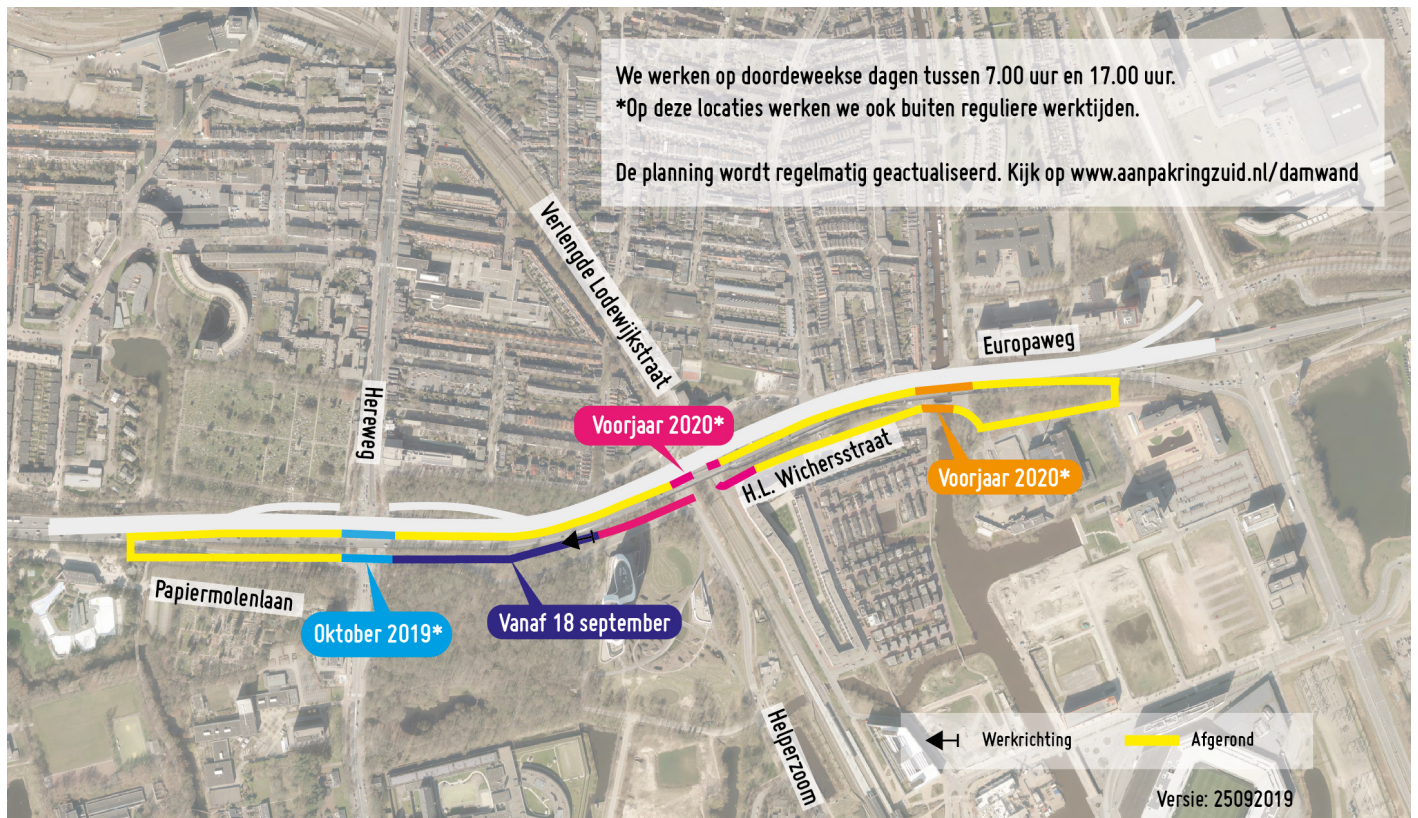

Gemeten waarden

Geluid, trillingen en deformatie

Geluid

Gemiddeld geluidsniveau dB(A)					
Meetlocatie	27 sept 2019 dag	30 sept 2019 dag	1 okt 2019 dag	2 okt 2019 dag	3 okt 2019 dag
Waterloolaan 28	60	59	60	59	62
Meeuwerderbaan 2	56	56	55	55	63
Meeuwerderbaan 24b	59	59	58	58	58
Kempkensberg 12	59	58	60	58	63
'De Frontier'	52	53	56	54	54
H.L. Wichersstraat 1/2	51	53	56	56	54
H.L. Wichersstraat 29a	52	54	55	54	54

Trilling (27, 30 september, 1, 2 en 3 oktober 2019)

De trillingen zijn gemeten ten aanzien van de dichtstbijzijnde objecten. De gepresenteerde waarde betreft de maximaal gemeten waarde.

Meetlocatie	Alarmwaarde (30Hz)	Grenswaarde (30Hz)	Gemeten waarde
Kempkensberg 12	2,25mm/s	2,50mm/s	2,15mm/s
Theehuis	1,24mm/s	1,38mm/s	1,47mm/s*

* Hoge meetwaarde komt voort uit het verwijderen verharding fietspad Hereweg. De werkwijze is na de melding aangepast, waarna de hoogst gemeten waarde 1,01mm/s betrof.

Deformatie

De eventuele deformaties worden ten aanzien van de volgende objecten gemonitord:

1. **Gebouwen**
2. **Riolering**

De kunstwerken en gewapende grondconstructie worden niet meer gemonitord. Omdat de werkzaamheden hier niet meer in de buurt plaatsvinden.

1. Gebouwen

Er zijn enkele minimale zettingen van gebouwen geconstateerd. Deze minimale zettingen liggen ruim binnen de gestelde grenswaarden.

2. Riolering

Er zijn enkele minimale zettingen van de riolering geconstateerd. Deze minimale zettingen liggen ruim binnen de gestelde grenswaarden.

Respons omgeving 27 september tot 4 oktober



We hebben 1 melding binnengekregen gerelateerd aan geluid. In de vorige wekelijkse rapportage waren dit er vijf. De melding was een verzoek voor de compensatie- en maatwerkregeling, namelijk een alternatieve werkplek*. Deze melding is nog in behandeling.



We hebben nul meldingen binnengekregen over trillingen. In de vorige wekelijkse rapportage was dit er één.



In de periode van 27 september tot 4 oktober 2019 zijn er vier nieuwe schademeldingen binnengekomen. Deze zijn meldingen zijn nog in behandeling.

* Voor de maatwerkregelingen worden grenswaarden omtrent geluid aangehouden.



MELD U AAN VOOR DE SMS-SERVICE

Wilt u direct op de hoogte worden gehouden bij bijzonderheden of als werkzaamheden uitlopen? Meld u dan aan voor onze sms-service via:
www.aanpakringzuid.nl/aanmelden

CONTACT

Heeft u vragen of klachten over trillingen of geluid? Bel met het Loket Damwand: **050 210 01 45**.

Bel voor andere vragen naar het Loket verkeer en werkzaamheden: **050 367 89 89** of mail naar **info@aanpakringzuid.nl**.



MEER INFORMATIE

Op www.aanpakringzuid.nl/damwand vindt u actuele informatie over de werkzaamheden en antwoorden op veelgestelde vragen. Of volg ons via:



facebook.com/aanpakringzuid



[@aanpakringzuid](https://twitter.com/aanpakringzuid)



[@aanpakringzuid](https://www.instagram.com/aanpakringzuid)
