

Vaststellingsovereenkomst ARZ-CHP

19 januari 2021

Korte presentatie aan Raad en Staten



AANPAK RING ZUID



WELKOM

Toelichting door:

- Gedeputeerde Fleur Graper, provincie Groningen
- Wethouder Philip Broeksma, gemeente Groningen

-



2019 Plan van Aanpak Commissie Hertogh.
Aanbevelingen t.a.v. organisatie en samenwerking
-> Financiële angel moet uit het project



Februari 2020 Advies Taskforce Financiën



Juli 2020 Akkoord op hoofdlijnen



Januari 2021 Vaststellingsovereenkomst



Afspraken maken over:

- Geld
 - Risico's
 - Indexering
- Door beide partijen op te brengen
- Financiële angel er ook echt uit



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

FINANCIELE OPLOSSING



- Gegarandeerd maximumbedrag
- Opdrachtnemer staat er voor in dat het werk voor het gegarandeerd maximum bedrag wordt gerealiseerd.
- Opdrachtnemer boekt verlies af
- Verklaring financiële gezondheid project en garantie liquiditeit van twee grootste Duitse moederorganisaties

Oorspronkelijk budget



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

Actueel uitvoeringsbudget (incl. btw)		673,3
Af: prognose kosten opdrachtgever		
- Engineering en bouwkosten OG	5,2	
- Vastgoed/nadeelcompensatie	14,5	
- Bijkomende kosten	44,6	
- mobiliteitskosten	19,6	
		-/- 83,8
Beschikbaar voor opdrachtnemer (CHP) en als dekking voor onvoorzien (incl. btw)		589,5

Wat is het tekort?



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

- Nieuwe contractsom: € 652,2 miljoen incl. BTW
 - Post onvoorzien: € 45 miljoen incl. BTW
- Totaalsom: € 697,2 miljoen incl. BTW**

Beschikbaar oorspronkelijk projectbudget: € 589,5 miljoen incl. BTW (incl. risicoreservering € 45 miljoen)

Verhoging indexering: € 5,7 miljoen


Op het tekort inclusief btw van € 102 miljoen worden de aanvullende kosten van Groningen Bereikbaar in mindering gebracht. Deze kosten van € 7 miljoen worden buiten het project gefinancierd.



- Er resteert dan een tekort van € 95 miljoen incl. btw = € 78 miljoen exclusief btw.
- Op basis van het convenant Regio Specifiek Pakket (RSP) en de bestuursovereenkomst Aanpak Ring Zuid moet deze kostenstijging worden opgevangen binnen het RSP programma.


€ 78 miljoen ex. BTW te dekken uit:

- N33 Midden: € 59,2 mln.
- Wunderline: € 18,8 mln.

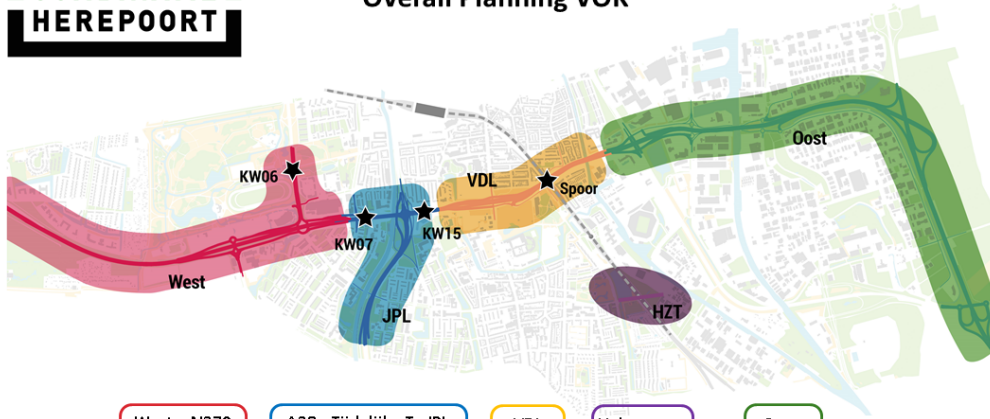

Planning in Vaststellingsovereenkomst

Realisatie 2024, openstelling hoofdwegennet.

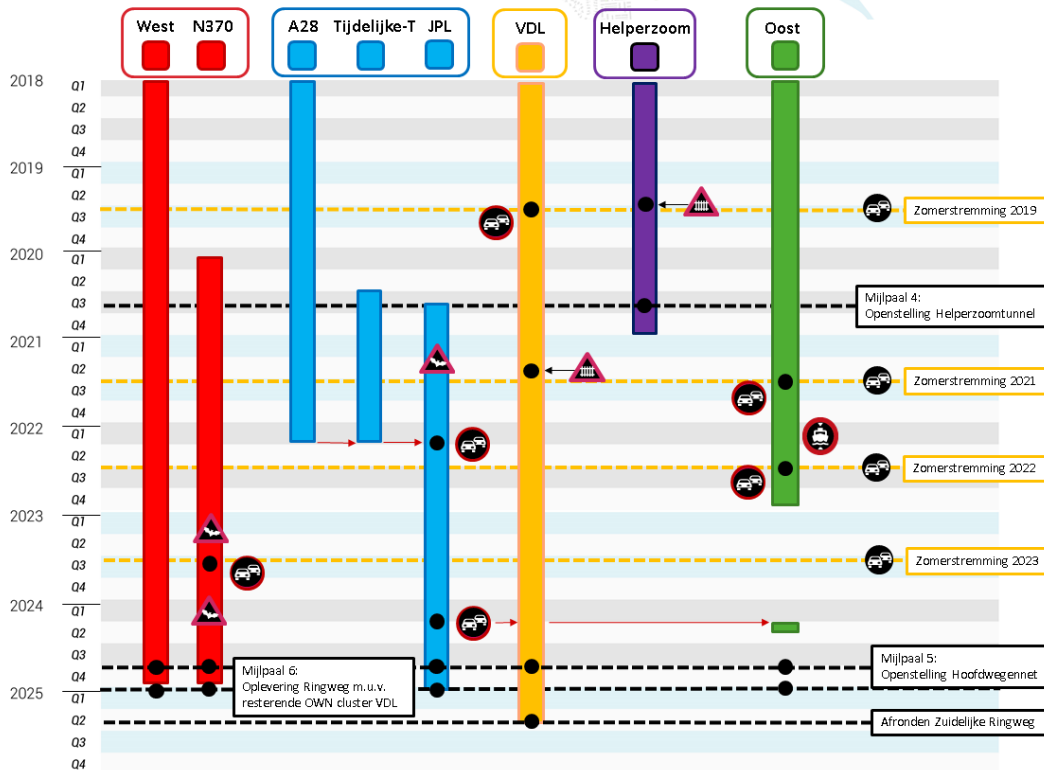

Legenda

- Zomerstremmingen
- Verkeershinder/Stremming
- Buitendienststelling spoor
- Hoogtebeperking vaarweg
- Raakvlak met vleermuizensoorten
- Raakvlakken/Afhankelijkheden
- Contractuele Mijlpalen



- Vaststellingsovereenkomst onder voorbehoud van instemming van Provinciale Staten
- Voordracht is beschikbaar incl. bijlagen.



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

VRAGEN?





AANPAK RING ZUID

Maakt Groningen klaar voor morgen

AANPAK RING ZUID
