

Bijeenkomst Wijkoverleggen
10 april 2019

AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen



AANPAK RING ZUID



- Commissie Hertogh
- Werkzaamheden tot en met de zomer 2019
- Communicatie met de omgeving

Geen grote zichtbare werkzaamheden de komende maanden

JOHN

18 SEPTEMBER 2018

WEST, JULIANAPLEIN, ZUIDERPLANTSOEN, HIRSHMAN/COENDERSBOORD, RIJSE

Naar verwachting starten de komende maanden geen grote zichtbare werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Aanpak Ring Zuid stelt eisen aan de kwaliteit van het project. Het Rijk, de provincie en de gemeente vinden het nodig in overleg met Combinatie Herepoort eerst een aantal zaken goed op orde te hebben. Daarom hebben Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort gezamenlijk besloten een commissie in te stellen die hierover advies gaat geven. Ondertussen gaan het werk dat al in uitvoering is en de voorbereiding van werkzaamheden gewoon door. Dat schrijven de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten in een voortgangsbrief aan de gemeenteraad en Provinciale Staten.

Eerder dit jaar werd bekend dat de ombouw van de zuidelijke ringweg mogelijk tot drie jaar vertraging zou oplopen. Een gedeeltelijke stremming van de ringweg in de zomermaanden om het inslaan van damwanden mogelijk te maken, had de vertraging moeten verkleinen. Toen bleek dat binnen de beschikbare tijd onvoldoende kon worden aangetoond dat de risico's voor de omgeving beheerst waren, was er voor de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid geen ander besluit mogelijk dan deze niet door te laten gaan. Aan Combinatie Herepoort is gevraagd de consequenties voor de planning daarvan in beeld te brengen.

Instellen gezamenlijke commissie

In de afgelopen weken heeft de stuurgroep opnieuw gesprekken gevoerd met de top van de twee Duitse ondernemingen in de aannemerscombinatie: Max Bögl en Züblin. Daarin is vastgesteld dat de aannemer alle zeilen moet bijzetten om te voldoen aan de contractuele eisen van het complexe project. Dit heeft gevolgen voor de planning van het project, de kwaliteit van de voorbereiding, de kwaliteit van het werk en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.



CLAUDIA ⌚ 20 DECEMBER 2018 💬 10

WEST, JULIANAPLEIN, ZUIDERPLANTSOEN, HELPMAN/COENDERSBOEG, OOST

Commissie Hertogh: Waar een wil is, komt een weg

Waar een wil is, komt een weg, is de titel van het rapport van de Commissie Hertogh, dat 20 december werd gepresenteerd door voorzitter prof. dr. ir....



CLAUDIA ⌚ 31 OKTOBER 2018 💬 6

Commissie-Hertogh volop aan het werk

Op 18 september jl. werd bekend gemaakt dat Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort een adviescommissie in het leven hebben geroepen om oplossingsrichtingen...



CLAUDIA ⌚ 26 SEPTEMBER 2018 💬 15

WEST, JULIANAPLEIN, ZUIDERPLANTSOEN, HELPMAN/COENDERSBOEG, OOST

Commissie Hertogh – Aanpak Ring Zuid: hoe en wat?

Er leven nog veel vragen over de commissie, die oplossingsrichtingen gaat aandragen voor het vervolg van de ombouw van de zuidelijke ringweg. In dit artikel...




Nieuws ▾ Weer Radio ▾ Televisie ▾ Aardbevingen ▾ Noordzaken Adverteren

'Voldoende vertrouwen' om door te gaan met aanleg zuidelijke ringweg



Zo moet het er uiteindelijk uit komen te zien (Foto: VIA Drupsteen)



De aanleg van de zuidelijke ringweg rond de stad Groningen kan zonder aanpassingen in het contract doorgaan. Dat zegt de commissie die onderzoek deed naar de impasse die is ontstaan




1. Slagvaardige organisatie en overlegstructuur
2. **Houding en gedrag: “Mijn succes is jouw succes”**
3. Herstart inhoudelijke werkzaamheden
4. Alliantie voortzetten
5. **Robuuste planning**
6. Financiën
7. Plan van aanpak en vastleggen resultaten



- Mijn succes is jouw succes.
- Excelleren op omgeving: 'Draagvlak en begrip van stakeholders'.
- Werken in een stedelijke omgeving vraagt meer inspanning om draagvlak te behouden.
- We gaan nog heel veel hinder veroorzaken. Daar zijn we open en transparant over, ook over problemen en risico's.



- We hebben een robuuste planning
- Zuidelijke ringweg is open medio 2024
- Afronding werkzaamheden in voorjaar 2025

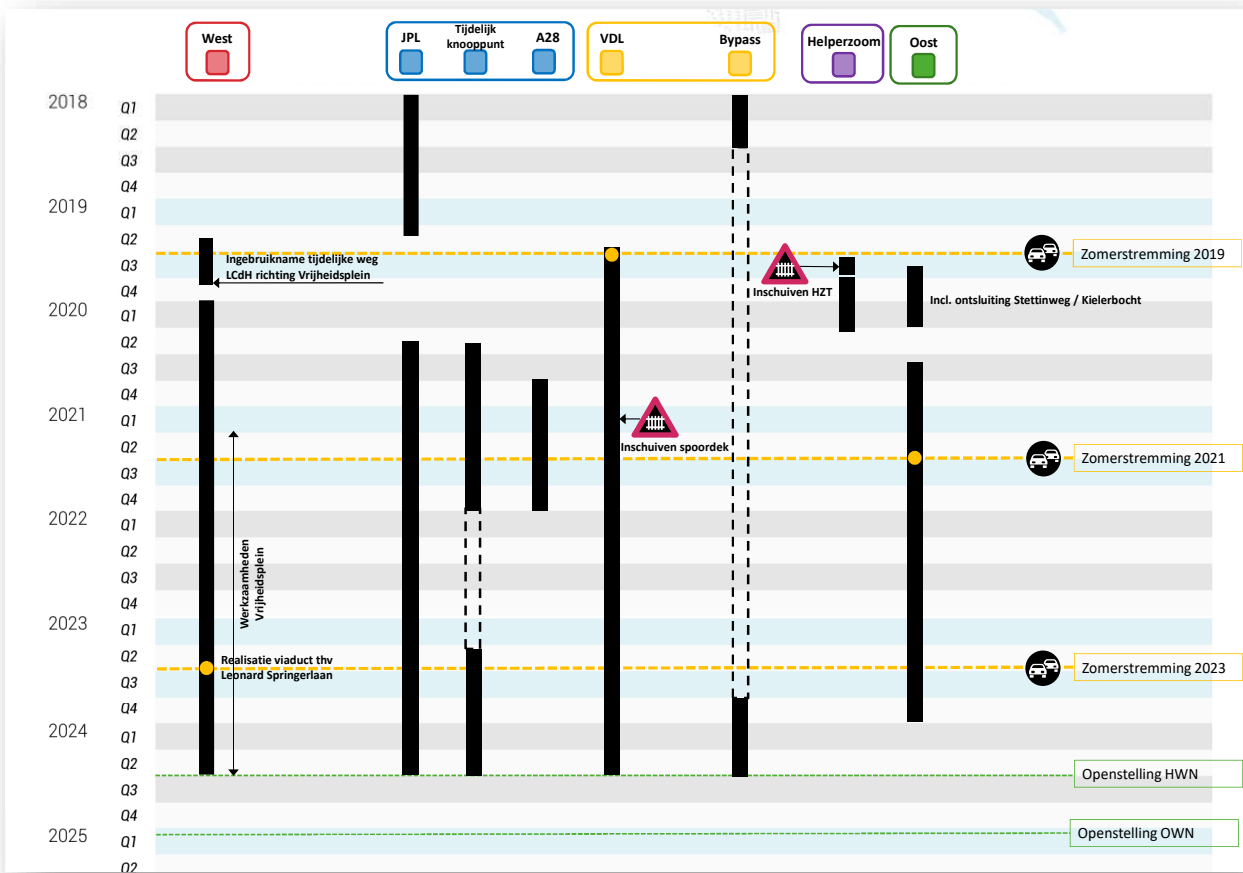



Vrijheidsplein
Renovatiewerkzaamheden

Tussen Julianaplein en Europaplein
Intrillen van damwanden

Waterloolaan
Inrichten tweerichtingsverkeer

Brailleweg
Sloop bestaand viaduct


Noord-Willemskanaal
Damwanden plaatsen

Hereweg
Gedeeltelijke sloop viaduct

Tussen Esperantokruising en Oude Winschoterdiep
Sloop oude zuidbaan en oude afrit Oosterpoort

Kempkensberg
Afgraven talud

Inschuijen en afbouwen Helperzoomtunnel

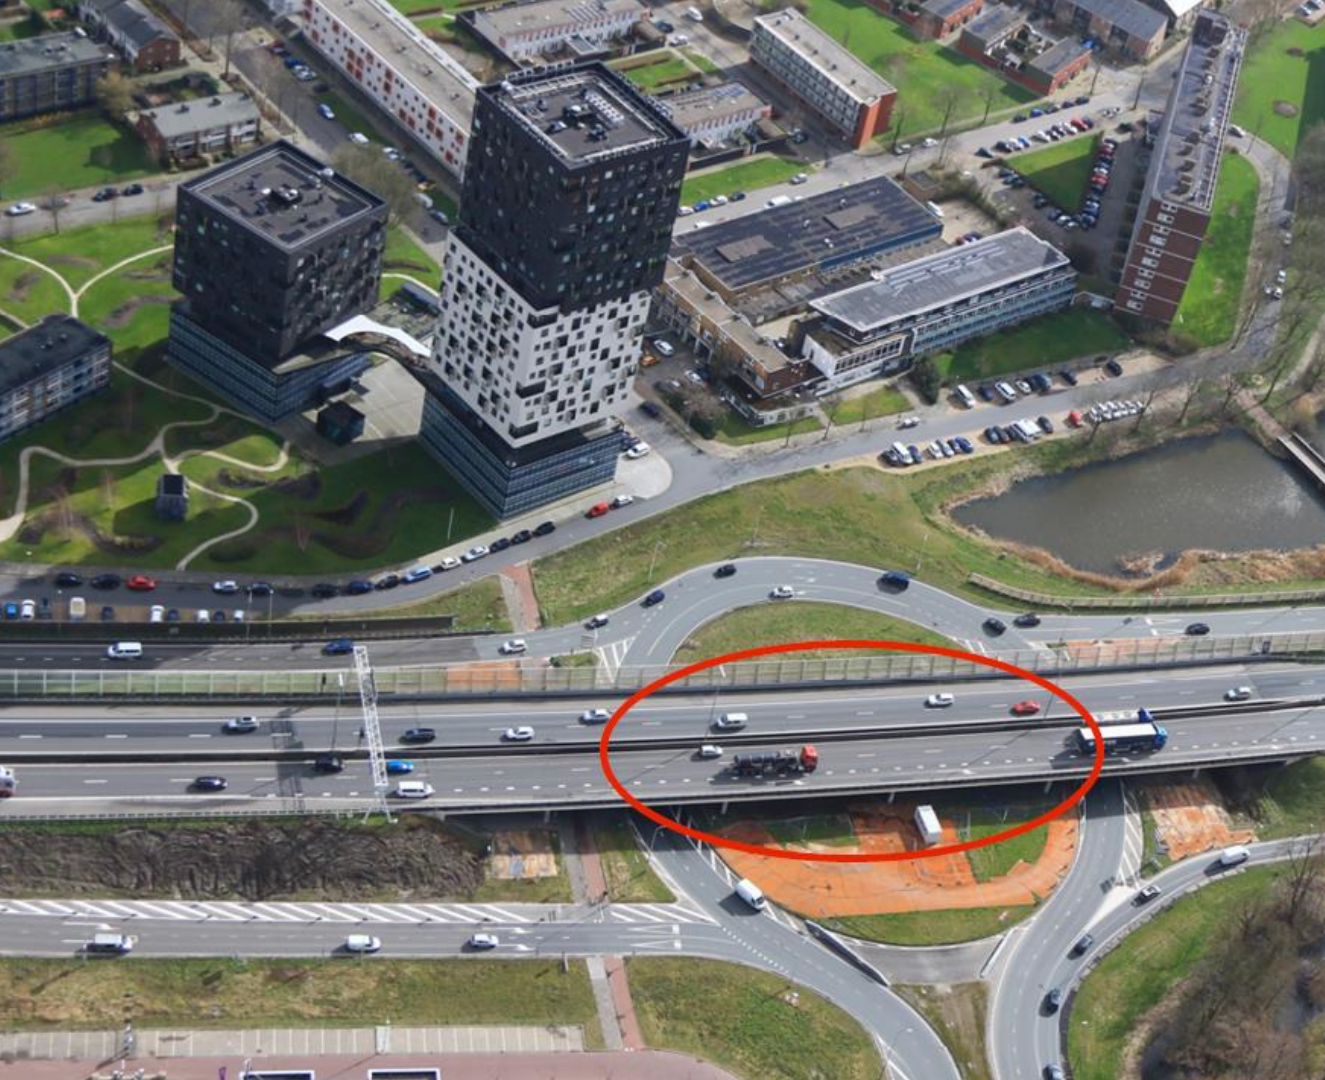

VRIJHEIDSPLEIN

Werkzaamheden

- Herstart renovatie viaduct
- Betonreparaties
- Bescherm laag aanbrengen

Periode

Maart tot en met juli 2019

Werktijden

Werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur

Hinder

Geluidsoverlast door hakwerk
Geen overlast voor het verkeer



BRAILLEWEG

Werkzaamheden

- Verplaatsen bouwterrein
- Voorbereiden sloop viaduct
- Slopen bestaand viaduct

Periode

April en mei 2019

Werktijden

Werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur
Sloopwerkzaamheden van 20 april tot en met 5 mei iedere dag (meivakantie)

Hinder

Geluidsoverlast door sloop
Brailleweg afgesloten van 20 april tot en met 5 mei
Geen nachtelijke werkzaamheden



Omfietsroute

OUDE ZUIDBAAN

Werkzaamheden

- Asfalt verwijderen
- Barriers verwijderen
- Geluidsschermen slopen
- Sloop oude oprit Oosterpoort
- Sloop oude zuidbaan

Periode

April tot en met juni 2019

Werktijden

Werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur

Hinder

Geluidsoverlast door sloopwerkzaamheden
Extra bouwverkeer via Winschoterdiep
Geluidswerenddoek blijft tot begin juni



BOUWTERREIN HL WICHERSSTRAAT

Werkzaamheden

- Inrichten bouwterrein en parkeerterrein (onder viaduct)

Periode

Najaar 2019

Werktijden

Werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur

Hinder

Bouwterrein en bouwketen blijven komende jaren in gebruik



An aerial photograph of a highway interchange. A red circle highlights a section of the road on the right side of the highway, just before a bridge. The surrounding area includes a large forested area on the left, a parking lot with many cars on the right, and a multi-story building. The highway has multiple lanes with traffic, including several trucks.

HEREWEG

Werkzaamheden

- Voorbereidende werkzaamheden voor lijnbussen en hulpdiensten
- Asfalt en oude geluidsschermen verwijderen
- Oude viaduct slopen (zuidzijde)
- Enkele liggers uithijzen (asbest)

Periode

Juni en juli 2019

Werktijden

Werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur

Hinder

Sloop viaduct in weekenden 21-24 juni,
29 juni-1 juli en 5-8 juli
24 uur per dag werkzaamheden
Mogelijk geluidsoverlast



NOORD-WILLEMSKANAAL

Werkzaamheden

- Vernieuwen kade Noord-Willemskanaal
- Intrillen damwanden vanaf het water vanaf pontons

Periode

Juni, juli en september 2019

Werktijden

Werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur

Hinder

Fietspad langs Noord-Willemskanaal tussen Van Iddekingeweg en Brailleweg tijdens werkzaamheden gesloten

WATERLOOLAAN

Werkzaamheden

- Aanpassen weginrichting
- Aanleg fietsstroken, verhoogde kruisingen en parkeerplaatsen
- Plaatsen verkeerslichten Waterlooiaan-Hereweg

Periode

Zomer 2019

Werktijden

Werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur

Hinder

Waterlooiaan (deels/tijdelijk) afgesloten



AFGRAVEN TALUD KEMPKENSBERG

Werkzaamheden

- Verwijderen van Japanse duizendknoop
- Ontgraven talud oude zuidbaan langs de Kempkensberg zuidzijde
- Onderdeel van ontmantelen oude zuidbaan

Periode


Zomer 2019 (exacte datum onbekend)


Werktijden

Werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur

Hinder

Geen hinder voor het verkeer

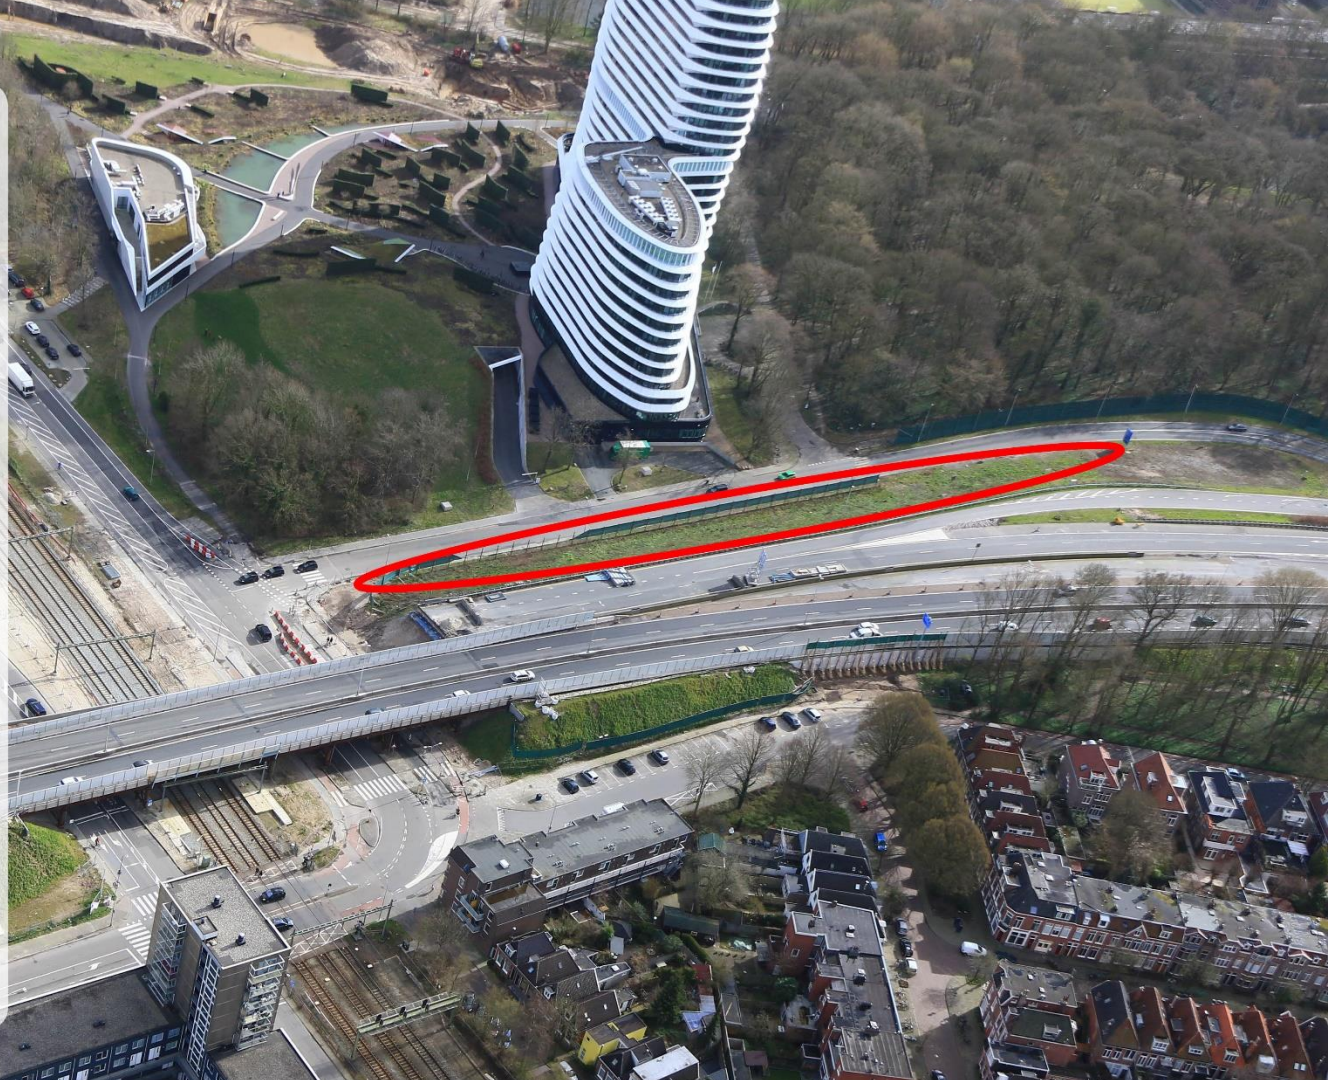

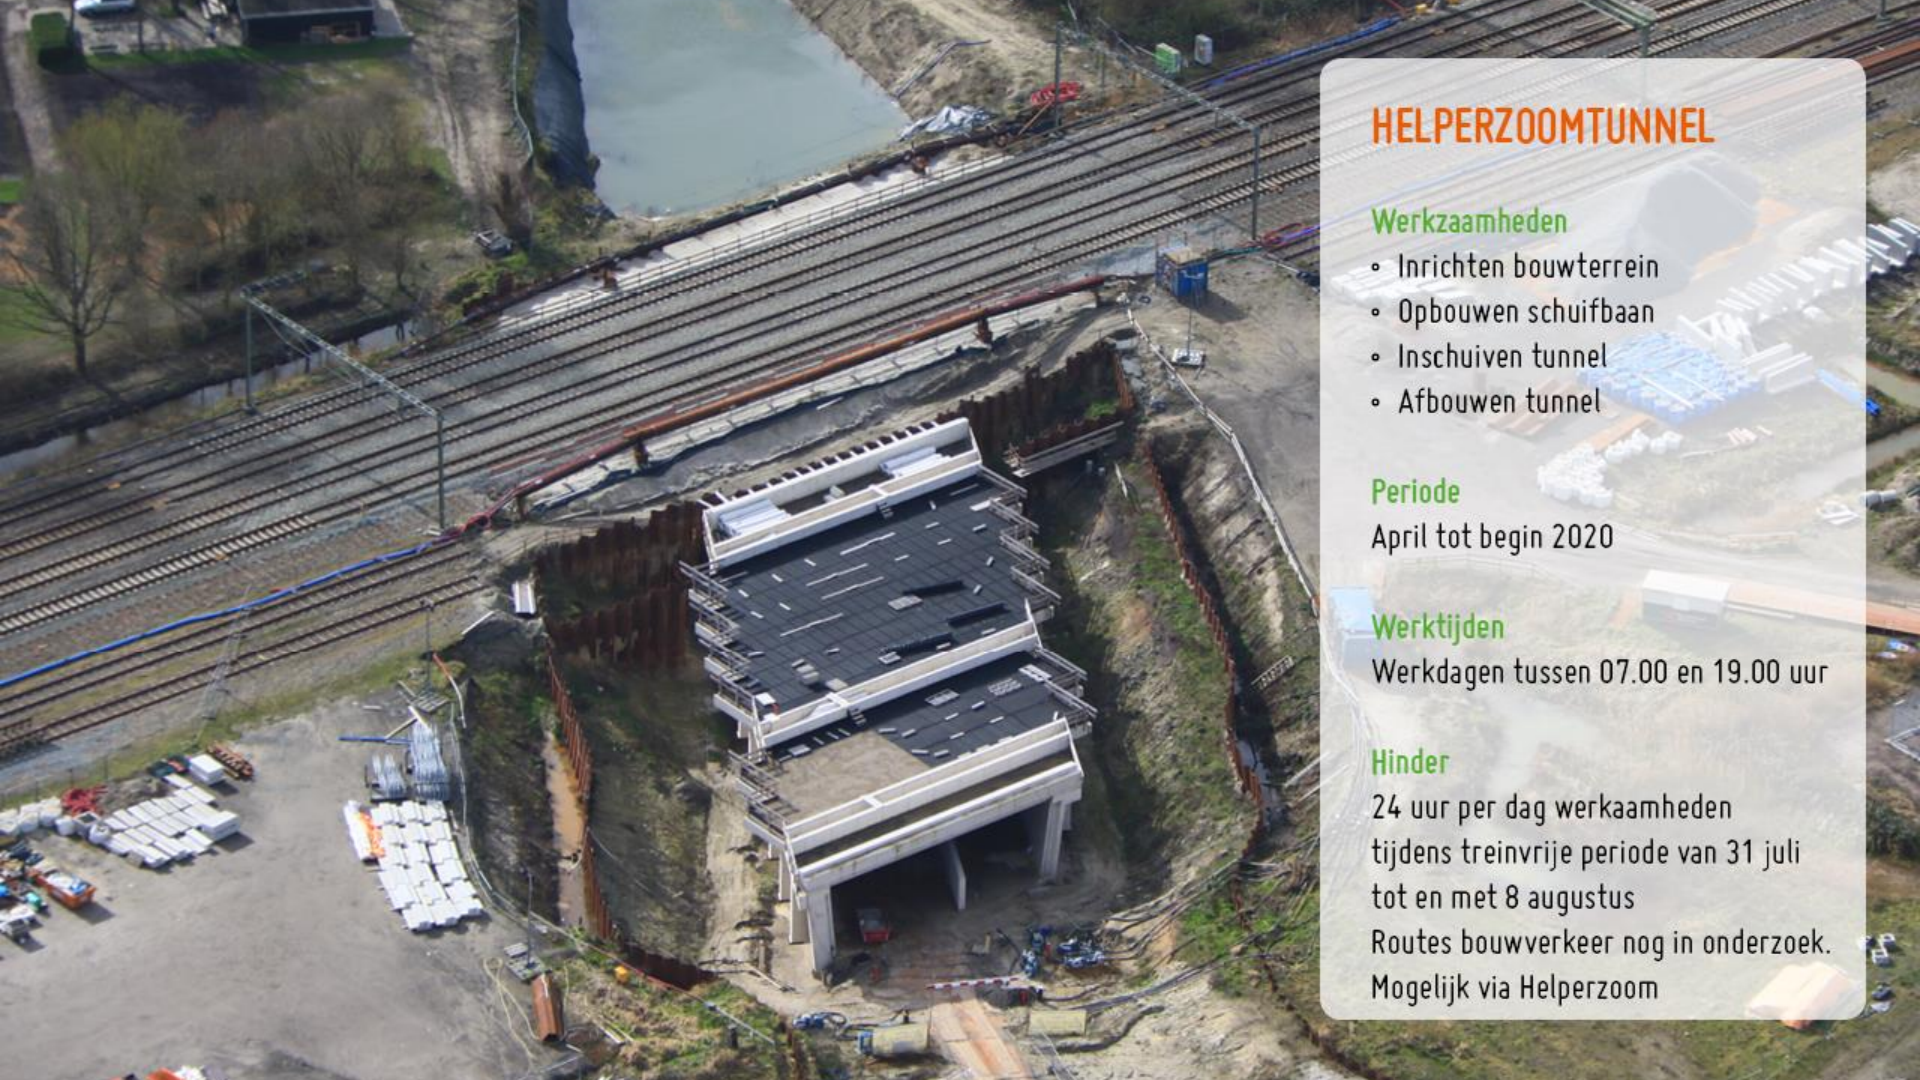

HELPERZOOMTUNNEL

Werkzaamheden

- Inrichten bouwterrein
- Opbouwen schuifbaan
- Inschuiven tunnel
- Afbouwen tunnel

Periode

April tot begin 2020

Werktijden

Werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur

Hinder

24 uur per dag werkzaamheden
tijdens treinvrije periode van 31 juli
tot en met 8 augustus
Routes bouwverkeer nog in onderzoek.
Mogelijk via Helperzoom



INTRILLEN DAMWANDEN

Werkzaamheden

- Intrillen damwanden
- Verankeren damwanden
- Aanleggen bouwkuip voor verdiepte ligging/Zuiderplantsoen

Periode

Juli tot december 2019

Werktijden

Werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur
Zaterdagen voor uitloop

Hinder

Veel geluids- en trillingsoverlast
Veel extra bouwverkeer
Verkeer Julianaplein -> Europaplein
gestremd van 13 juli tot en met 25 augustus



- 2x 1.100 meter damplanken voor damwand bouwkuip verdiepte ligging
- In 2018 afgeblazen vanwege:
 - Onvoldoende tijd voor een goed ontwerp voor bouwkuip verdiepte ligging
 - Gevolgen van verankering van damwanden onder gebouwen, viaducten, kabels en leidingen niet duidelijk genoeg.
 - Gevolgen van wegpompen grondwater op gebouwen en groen onvoldoende in beeld (risico's op verzakken van gebouwen en verdrogen Sterrebos)
- Nu onder leiding van Dhr. Hertogh damwandontwerp op orde
- Kennis en kunde van Aanpak Ring Zuid, Combinatie Herepoort en waterschap gebundeld
- Samen keuzes maken en risico's beheersen



- In 2017 proeven gedaan met intrillen damwanden
- Modellen voorspellen goed tot zeer goed de realiteit
- Overlast door trillingen en geluid blijft!
 - Scheurvorming → bouwkundige vooropname, trillingsmeters
 - Overschrijden toegestane geluidsnormen → geluidsmeters
 - Extra bouwverkeer, onder andere op Winschoterdiep



- Hierna filmpje met voorbeeld van intrillen damwanden
 - Representatief voor de methode die we gebruiken
 - Damplanken die wij gebruiken zijn langer (langere planken = langer intrillen = meer lawaai)
 - Geluid: door resonantie kan klank dichtbij anders/lager zijn dan verderop
 - Wij gebruiken 4 tot 5 heistellingen





- Goed bereikbaar in Paviljoen Ring Zuid of infokeet (eventueel vaker geopend)
- Regelmatige updates via website, Facebook en e-nieuwsbrieven
- Maatwerk richting omgeving:
 - Mogelijk huisbezoeken direct aanwonenden voorafgaand aan intrillen damwanden
 - SMS-service voor calamiteiten en onverwachte uitloop van werkzaamheden
- Volgende bijeenkomst wijkoverleggen in juni

Waar hebben jullie als bewoners behoefte aan?



Vragen, suggesties
OF FEEDBACK?
